


N°	Mode	Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
0			Planning Local lave bassin CMF B	33 jours	Lun 08/04/24	Mar 28/05/24	
1			Ordre de service	1 jour	Lun 08/04/24	Lun 08/04/24	
2			<u>C.2.55 & C.2.57</u>	17 jours	Lun 08/04/24	Mar 30/04/24	
3			Gros oeuvre	3 jours	Jeu 11/04/24	Lun 15/04/24	
4			Cantonnement de chantier	1 jour	Jeu 11/04/24	Jeu 11/04/24	10
5			Réalisation du carottage	1 jour	Ven 12/04/24	Ven 12/04/24	4
6			Dépose dalle faux-plafond	1 jour	Lun 15/04/24	Lun 15/04/24	5
7			Création ouverture pour trappe d'accès G.T.	1 jour	Lun 15/04/24	Lun 15/04/24	5
8			Cloison/Faux plafond	9 jours	Lun 08/04/24	Jeu 18/04/24	
9			Création de cloison (ex-passage)	1 jour	Lun 08/04/24	Lun 08/04/24	1DD
10			jointes cloisons	2 jours	Mar 09/04/24	Mer 10/04/24	9
11			Réalisation faux plafond hygiène	1 jour	Jeu 18/04/24	Jeu 18/04/24	21
12			Plomberie	17 jours	Lun 08/04/24	Mar 30/04/24	
13			Mise en sécurité extraction	1 jour	Lun 08/04/24	Lun 08/04/24	1DD
14			Création nouveaux réseaux	5 jours	Lun 15/04/24	Ven 19/04/24	5
15			Pose nouveaux équipements	1 jour	Lun 29/04/24	Lun 29/04/24	31
16			Test et réglage des équipements	1 jour	Mar 30/04/24	Mar 30/04/24	15
17			Courant faible	8 jours	Lun 08/04/24	Mer 17/04/24	
18			Mise en sécurité	1 jour	Lun 08/04/24	Lun 08/04/24	1DD
19			Réalisation des nouveaux réseaux CFO	1 jour	Lun 15/04/24	Lun 15/04/24	5
20			Pose équipements et raccordements	1 jour	Mar 16/04/24	Mar 16/04/24	19
21			Raccordement sur TD	1 jour	Mer 17/04/24	Mer 17/04/24	20
22			Menuiserie	16 jours	Lun 08/04/24	Lun 29/04/24	
23			Modification du sens d'ouverture de la porte du local C.2.57	1 jour	Lun 08/04/24	Lun 08/04/24	1DD
24			Réouverture, porte local C.2.55	1 jour	Lun 08/04/24	Lun 08/04/24	1DD
25			Fourniture , pose trappe d'accès G.T. avec cadre	1 jour	Lun 22/04/24	Lun 22/04/24	14
26			Fourniture , pose d'étagères, local C.2.55	1 jour	Lun 29/04/24	Lun 29/04/24	31
27			Peinture	4 jours	Mar 23/04/24	Ven 26/04/24	
28			Préparation des murs	1 jour	Mar 23/04/24	Mar 23/04/24	25
29			Mise en peinture des murs	1 jour	Mer 24/04/24	Mer 24/04/24	28
30			Pose protections murales	1 jour	Jeu 25/04/24	Jeu 25/04/24	29
31			Mise en peinture cadres de porte	1 jour	Ven 26/04/24	Ven 26/04/24	30
32			<u>C.2.52</u>	15 jours	Jeu 02/05/24	Lun 27/05/24	
33			Gros oeuvre	15 jours	Jeu 02/05/24	Lun 27/05/24	
34			Cantonnement de chantier	1 jour	Jeu 02/05/24	Jeu 02/05/24	16
35			Démolition cloison + cadre et porte	1 jour	Mar 07/05/24	Mar 07/05/24	45
36			Dépose et évacuation équipements non réutilisés	1 jour	Ven 10/05/24	Ven 10/05/24	35
37			Dépose faïence	2 jours	Lun 13/05/24	Mar 14/05/24	36
38			Dépose et évacuation contonnement de chantier	1 jour	Lun 27/05/24	Lun 27/05/24	48
39			Cloison/Faux plafond	3 jours	Mer 15/05/24	Ven 17/05/24	
40			Reprise des cloisons (anciennes faïences)	1 jour	Mer 15/05/24	Mer 15/05/24	37
41			jointes cloisons	2 jours	Jeu 16/05/24	Ven 17/05/24	40
42			Plomberie	3 jours	Jeu 02/05/24	Lun 06/05/24	
43			Déconnection, nettoyage et transfert vidroir vers C.2.55	1 jour	Jeu 02/05/24	Jeu 02/05/24	16
44			Mise en sécurité extraction	1 jour	Ven 03/05/24	Ven 03/05/24	43
45			Condamnation réseaux et évacuation équipements	1 jour	Lun 06/05/24	Lun 06/05/24	44
46			Peinture	4 jours	Mar 21/05/24	Ven 24/05/24	
47			Préparation des murs et plafond locaux	2 jours	Mar 21/05/24	Mer 22/05/24	41
48			Mise en peinture des murs et plafond locaux	2 jours	Jeu 23/05/24	Ven 24/05/24	47
49			RECEPTION	1 jour	Mar 28/05/24	Mar 28/05/24	38

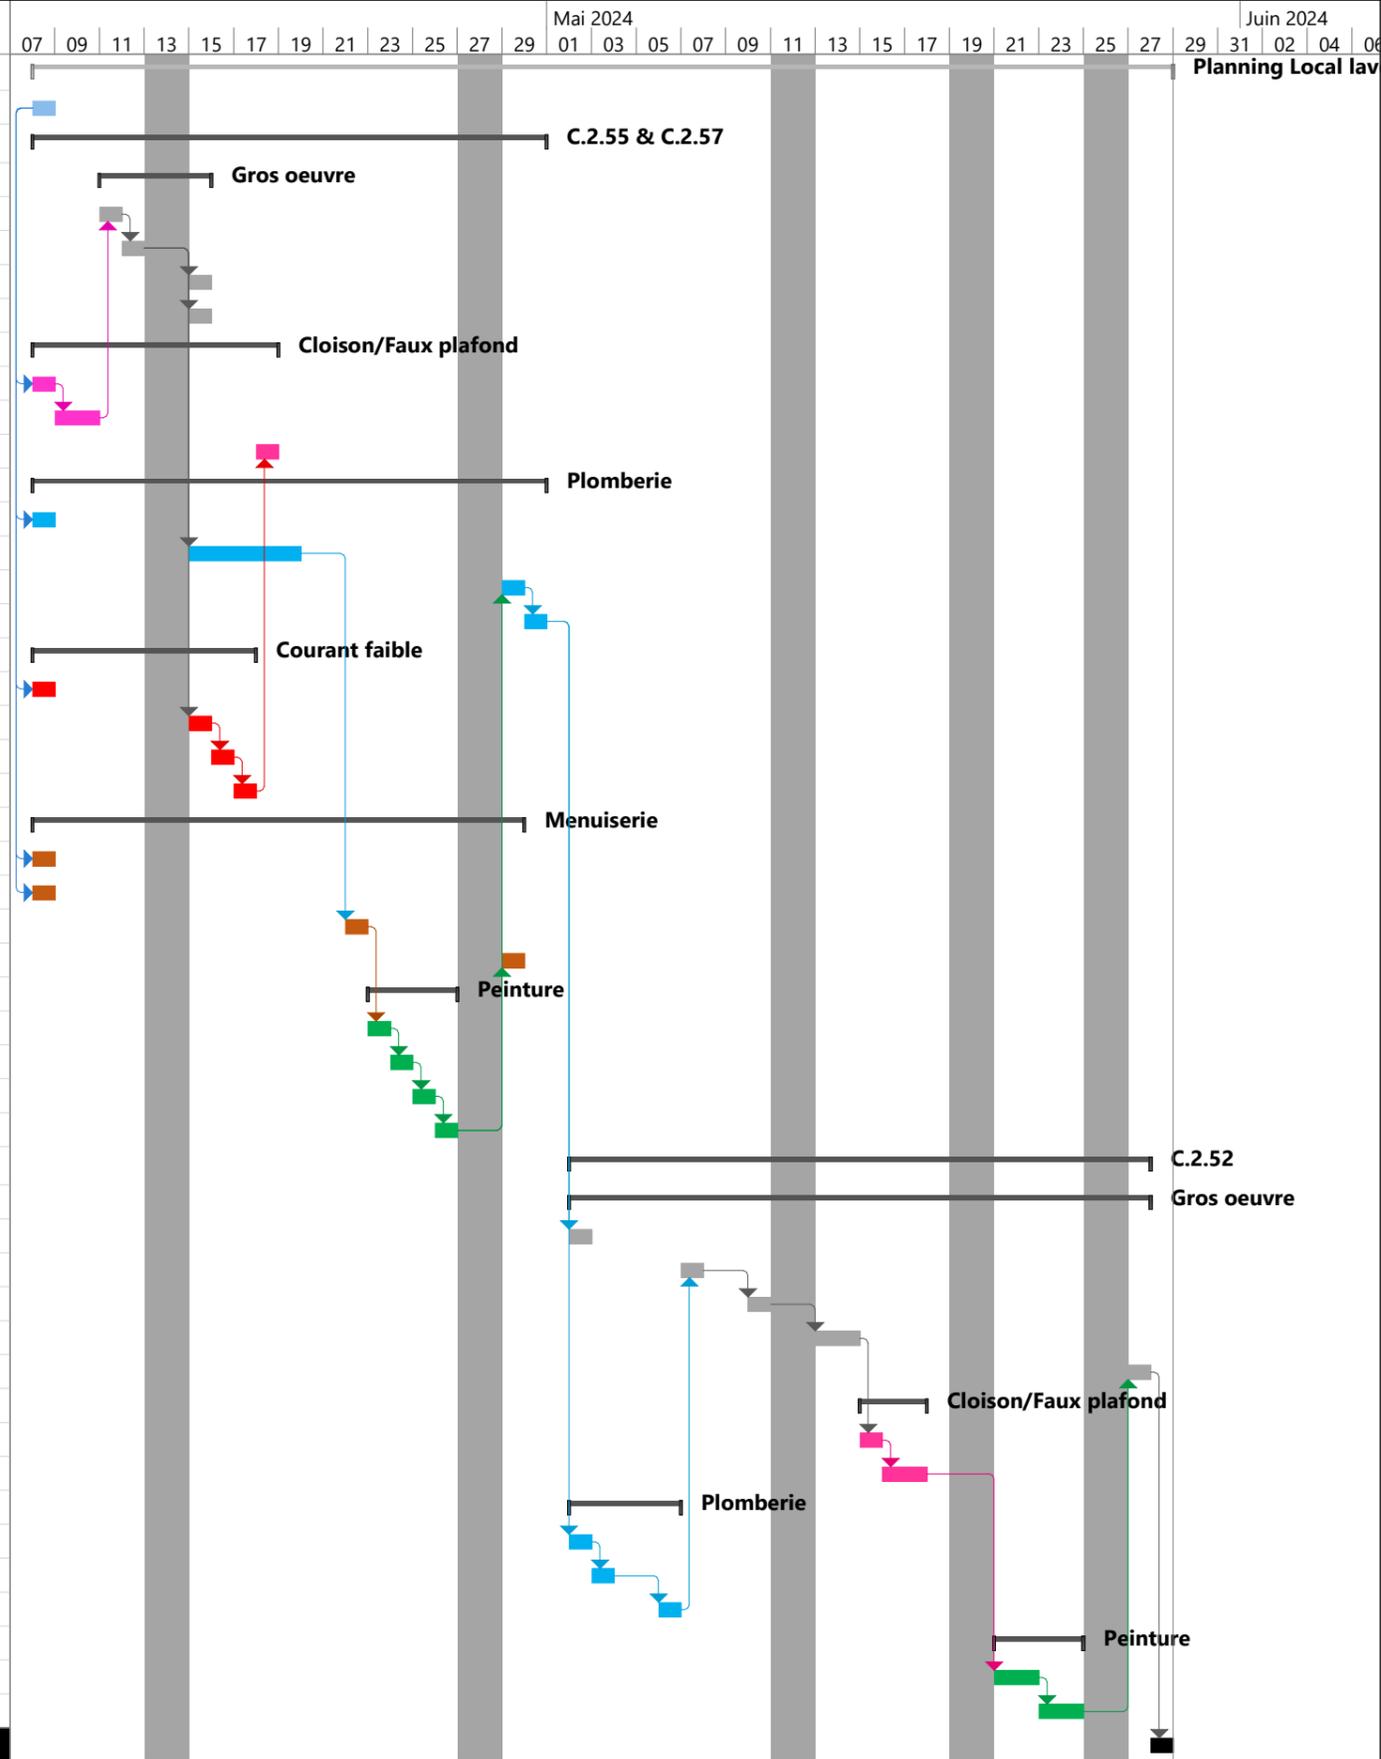

Projet : Planning Local lave bas Date : Lun 18/03/24	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			
